

Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře

Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339
Veřejná zakázka	VZ 04 Generální zhotovitel stavby – budova Vlašského dvora v rámci projektu „Revitalizace NKP Vlašský dvůr“
Odběratel:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01, Kutná Hora
Dodavatel:	Unistav Construction a.s.
Změnový list:	č.008
Předmět změny:	Změna v realizaci oken A11 3 NP
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	Změna podle § 222, odst. (6) ZZVZ, vzniklá v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky.
Zdůvodnění změny:	
Zjištění:	Změna v realizaci oken A11, 3NP-půda – po detailním očištění a průzkumu oken bylo zjištěno, že jejich stav je vyhovující.
Návrh řešení:	Ná základě výše uvedeného zjištění je možné provedení odborné opravy na místo plánované kompletní výměny. Odborná repase oken je plně v souladu s požadavky NPÚ.
Odpočet "méněprací":	
Připočet "víceprací":	
Dopad na cenu (saldo):	
Přílohy:	Příloha 1 Rozpočet
Souhlas zhotovitele:	
Souhlas TDI:	
Souhlas zástupce Národního památkového ústavu:	
Souhlas zástupce objednatele:	
Za objednatele převzal	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4755** **Revitalizace NKP Vlašský dvůr**

Objekt: **D2** **DODATEK č. 2 - FINAL**

Rozpočet: **ZL č. 008** **Změna v realizaci oken A**

Objednatel: **Město Kutná Hora** IČO: **00236195**
Havlíčkovo náměstí 552/1 DIČ: **CZ00236195**
28401 **Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město**

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** IČO: **03902447**
Příkop 838/6 DIČ: **CZ03902447**
60200 **Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		
Snížená DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		
Zaokrouhlení			
Cena celkem s DPH			

v Brně

dne

13.2.2019



Rekapitulace dílů


Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV				100
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D2	DODATEK č. 2 - FINAL
R:	ZL č. 008	Změna v realizaci oken A

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
1	766621281	okna A-výměna-stávající víceřídle jednoduché , demontáž včetně rámu, nové víceřídle dvojité stejný tvar i rozměry, dub, zasklení sklo ála Fourcault, kování dle pův, zafrézované těsnění, silnovrstvá	m2	-1,43800		
		A11 : -1,438		-1,43800		
2	766621281_R	okna A11 - repase	m2	1,43800		
3	998766204R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	%	-115,04000		

Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře

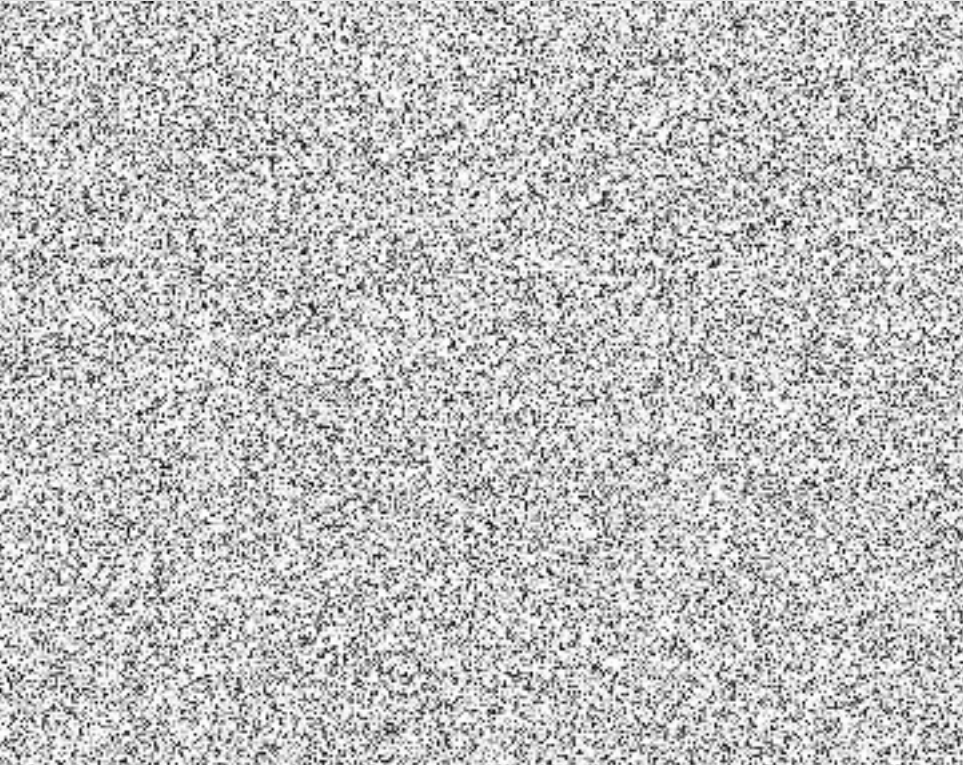Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339
Veřejná zakázka	VZ 04 Generální zhotovitel stavby – budova Vlašského dvora v rámci projektu „Revitalizace NKP Vlašský dvůr“
Odběratel:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01, Kutná Hora
Dodavatel:	Unistav Construction a.s.
Změnový list:	č.009
Předmět změny:	Změna v realizaci oken – C8 -WC ženy 1 a 2.NP
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	Změna podle § 222, odst. (6) ZZVZ, vzniklá v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky.
Zdůvodnění změny:	
Zjištění:	Změna v realizaci oken – C8 -WC ženy 1 a 2.NP - po detailním očištění a průzkumu oken bylo zjištěno, že jejich stav je vyhovující a je tak možné provedení pouze v režimu odborné opravy. Odborná repase oken je plně v souladu s požadavky NPÚ. Jedná se o uznatelné výdaje.
Návrh řešení:	Ná základě výše uvedeného zjištění je tak možné provedení pouze v režimu odborné opravy. Odborná repase oken je plně v souladu s požadavky NPÚ.
Odpočet "méněprací":	
Přípočet "víceprací":	
Dopad na cenu (saldo):	
Přílohy:	Příloha 1 Rozpočet
Souhlas zhotovitele:	
Souhlas TDI:	
Souhlas zástupce Národního památkového ústavu:	
Souhlas zástupce objednatele:	
Za objednatele převzal	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4755** **Revitalizace NKP Vlašský dvůr**

Objekt: **D2** **DODATEK č. 2 - FINAL**

Rozpočet: **ZL č. 009** **Změna v realizaci oken - C**

Objednatel: **Město Kutná Hora** IČO: **00236195**
Havlíčkovo náměstí 552/1 DIČ: **CZ00236195**
28401 **Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město**

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** IČO: **03902447**
Příkop 838/6 DIČ: **CZ03902447**
60200 **Brno**


Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		
Snížená DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		
Zaokrouhlení			
Cena celkem s DPH			

v Brně dne 13.2.2019



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV				100
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D2	DODATEK č. 2 - FINAL
R:	ZL č. 009	Změna v realizaci oken - C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
1	766621287	okna C-repase úplná-stávající vícekřídle dvojité , demontáž včetně rámu, vyjmout vitráž a vložit do nového křídla, dub, vnitřní zasklení sklo ála Fourcault, kování dle pův, zafrézované těsnění,	m2	-3,99000		
					C8 : -3,99	-3,99000
2	766621287_R	okna C-repase částečná	m2	3,99000		
3	998766204R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	%	-199,50000		

Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře

Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339
Veřejná zakázka	VZ 04 Generální zhotovitel stavby – budova Vlašského dvora v rámci projektu „Revitalizace NKP Vlašský dvůr“
Odběratel:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01, Kutná Hora
Dodavatel:	Unistav Construction a.s.
Změnový list:	č.010
Předmět změny:	Demontáž těles pro provedení omítky etapa VII (1NP západní křídlo) a XII (2NP JZP křídlo eko)
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	Dodatečné stavební práce podle § 222, odst. (5) ZZVZ, které nebyly zahrnuty v původním závazku, ale jsou nezbytné pro dokončení zakázky. Změna v osobě zadavatele není možná a způsobila by zadavateli obtíže a výrazně zvýšila náklady.
Zdůvodnění změny:	
Zjištění:	Demontáž těles pro provedení omítky etapa VII (1NP západní křídlo) a XII (2NP JZP křídlo eko) – při kontrole omítek bylo zjištěno jejich nevyhovující provedení za stávajícími radiátory.
Návrh řešení:	Ná základě výše uvedeného zjištění bylo rozhodnuto o jejich demontáži, provedení opravy omítek a následné zpětné montáži radiátorů.
Odpočet "méněprací":	
Připočet "víceprací":	
Dopad na cenu (saldo):	
Přílohy:	Příloha 1 Rozpočet
Souhlas zhotovitele:	
Souhlas TDI:	
Souhlas zástupce Národního památkového ústavu:	
Souhlas zástupce objednatele:	
Za objednatele převzal	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4755** **Revitalizace NKP Vlašský dvůr**

Objekt: **D2** **DODATEK č. 2 - FINAL**

Rozpočet: **ZL č. 010** **Demontáž těles pro provedení omítky**

Objednatel: **Město Kutná Hora**

IČO: **00236195**

Havlíčkovo náměstí 552/1

DIČ: **CZ00236195**

28401

Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.**

IČO: **03902447**

Příkop 838/6

DIČ: **CZ03902447**

60200

Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

Snížená DPH

15 %

Základ pro základní DPH

21 %

Základní DPH

21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v Brně

dne 13.2.2019



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
735	Otopná tělesa	PSV				100
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D2	DODATEK č. 2 - FINAL
R:	ZL č. 010	Demontáž těles pro provedení omítky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 735		Otopná tělesa				
1	735159230R00	Montáž panelových těles 2řadých do délky 1980 mm	kus	13,00000		
2	735151822R00	Demontáž otopných těles panelových 2řadých, 2820 mm	kus	13,00000		
3	48485999R	Držák radiátoru 15/140	kus	26,00000		
4	55120099990R	Vekolux radiátorový přímý 3/4"	kus	13,00000		

Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře

Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339
Veřejná zakázka	VZ 04 Generální zhotovitel stavby – budova Vlašského dvora v rámci projektu „Revitalizace NKP Vlašský dvůr“
Odběratel:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01, Kutná Hora
Dodavatel:	Unistav Construction a.s.
Změnový list:	č.011

Předmět změny:	Úprava únikového průchodu nad kaplí, přeložka topení
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	Změna podle § 222, odst. (6) ZZVZ, vzniklá v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky.

Zdůvodnění změny:	
Zjištění:	Úprava únikového průchodu nad kaplí, přeložka topení – po probourání otvoru ve stěně v půdním prostoru bylo zjištěno, že v místě plánovaného únikového schodiště se nachází stávající páteřní rozvod vytápění.

Návrh řešení: Pro dodržení plánovaných parametrů únikové cesty bylo nutné provedení přeložení této části kolizní trasy potrubí ÚT včetně drobné stavební úpravy trasy, tak aby byla úniková cesta plně funkční.

Odpočet "méněprací":

Připočet "víceprací":

Dopad na cenu (saldo):

Přílohy: Příloha 1 Rozpočet

Souhlas zhotovitele:

Souhlas TDI:

Souhlas zástupce Národního památkového ústavu:

Souhlas zástupce objednatele:

Za objednatele převzal

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4755** **Revitalizace NKP Vlašský dvůr**

Objekt: **D2** **DODATEK č. 2 - FINAL**

Rozpočet: **ZL č. 011** **Úprava průchodu kaplí, přeložka topení**

Objednatel: **Město Kutná Hora**

IČO: **00236195**

Havlíčkovo náměstí 552/1

DIČ: **CZ00236195**

28401

Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.**

IČO: **03902447**

Příkop 838/6

DIČ: **CZ03902447**

60200

Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

Snížená DPH

15 %

Základ pro základní DPH

21 %

Základní DPH

21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v

Brno

dne

13.2.2019



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				26
99	Staveništní přesun hmot	HSV				0
733	Rozvod potrubí	PSV				4
735	Otopná tělesa	PSV				70
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D2	DODATEK č. 2 - FINAL
R:	ZL č. 011	Úprava průchodu kaplí, přeložka topení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod	60,00000		
		vybourání zdiva - úprava na schodišťové stupně a jejich dobetonování (2 pracovníci, 10 hod, 3 dny) : 2*10*3		60,00000		
2	58556678751R	Baumit Beton B 30 beton	t	0,24000		
		6*0,04		0,24000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
3	998018003U00	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace	t	0,24000		
Díl: 735		Otopná tělesa				
4	552	Vypuštění a napuštění otopné soustavy	kpl	1,00000		
5	551	Vsazení ventilů vč. dodávky	ks	6,00000		
6	553	Tlaková zkouška	kpl	1,00000		
7	554	Přesun materiálu	kpl	1,00000		
8	550	Vypuštění a napuštění systému hlavního řadu	kpl	1,00000		
9	499	Vyřezání hlavního řadu ÚT pr. 50mm dl. 12m	kpl	1,00000		
10	498	Spojovací fitinky pr. 50mm	ks	12,00000		
11	497	Konzoly pro potrubí	ks	5,00000		
12	496	Izolace měděného potrubí	m	12,00000		
13	495	Pomocné práce	hod	4,00000		
14	494	Práce topenář	hod	12,00000		
15	493	Odvzdušnění systému	kpl	1,00000		
Díl: 733		Rozvod potrubí				
16	733163108R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 54 x 2,0 mm	m	2,00000		

Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře

Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339
Veřejná zakázka	VZ 04 Generální zhotovitel stavby – budova Vlašského dvora v rámci projektu ‚Revitalizace NKP Vlašský dvůr‘
Odběratel:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01, Kutná Hora
Dodavatel:	Unistav Construction a.s.
Změnový list:	č.012
Předmět změny:	Záměna standardních dveří za bezpečnostní v m.č. 238
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	Dodatečné stavební práce podle § 222, odst. (5) ZZVZ, které nebyly zahrnuty v původním závazku, ale jsou nezbytné pro dokončení zakázky. Změna v osobě zadavatele není možná a způsobila by zadavateli obtíže a výrazně zvýšila náklady.
Zdůvodnění změny:	
Zjištění:	Záměna standardních dveří za bezpečnostní v m.č. 238 z důvodu nově vzniklého požadavku na umístění trezoru v pokladně ekonomického odboru.
Návrh řešení:	Na základě požadavku ekonomického odboru (v návaznosti na dodržení bezp. předpisu)u byly do místnosti „trezor“ umístěny bezpečnostní dveře s vícebodovým kováním.

Odpočet "méněprací":

Připočet "víceprací":

Dopad na cenu (saldo):

Přílohy:

Příloha 1 Rozpočet

Souhlas zhotovitele:

Souhlas TDI:

Souhlas zástupce Národního
památkového ústavu:

Souhlas zástupce objednatele:

Za objednatele převzal

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4755** **Revitalizace NKP Vlašský dvůr**

Objekt: **D2** **DODATEK č. 2 - FINAL**

Rozpočet: **ZL č. 012** **Záměna dveří za bezpečnostní**

Objednatel: **Město Kutná Hora** IČO: **00236195**
Havlíčkovo náměstí 552/1 DIČ: **CZ00236195**
28401 **Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město**

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** IČO: **03902447**
Příkop 838/6 DIČ: **CZ03902447**
60200 **Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		
Snížená DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		
Zaokrouhlení			
Cena celkem s DPH			

v Brně

dne 13.2.2019



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV				100
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D2	DODATEK č. 2 - FINAL
R:	ZL č. 012	Záměna dveří za bezpečnostní

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
1	766660901	dveře int. K1-dodávka a montáž dveří otvíravých 1křídlových do ocelové zárubně do sádkartonu, dveře dýha (kanceláře)	kus	-1,00000		
2	766660901_rev.	Dveře CAG CPL laminát bílá bezpečnostní	kus	1,00000		
3	766-001001	Samozavírač na požární dveře	ks	1,00000		
4	998766204	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	%	112,37260		

Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře

Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339
Veřejná zakázka	VZ 04 Generální zhotovitel stavby – budova Vlašského dvora v rámci projektu „Revitalizace NKP Vlašský dvůr“
Odběratel:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01, Kutná Hora
Dodavatel:	Unistav Construction a.s.
Změnový list:	č.013
Předmět změny:	Vytvoření místnosti pro diesel agregát
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	Změna podle § 222, odst. (6) ZZVZ, vzniklá v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a nemění celkovou povahu veřejné zakázky
Zdůvodnění změny:	
Zjištění:	Vytvoření místnosti pro diesel agregát - Při podrobném projednání PBR se zástupci HZS bylo konstatováno, že vhodnější než využít původně plánovaný prostor stávající kotelny k umístění nového diesel agregátu bude umístění do samostatného prostoru, jež bude tvořit samostatný požární úsek.
Návrh řešení:	Z výše uvedeného důvodu musela být zrealizována nová samostatná místnost ze SDK, která je umístěna vedle kotelny, ve které měl být diesel agregát původně umístěn.
Odpočet "méněprací":	
Připočet "víceprací":	
Dopad na cenu (saldo):	
Přílohy:	Příloha 1 Rozpočet
Souhlas zhotovitele:	
Souhlas TDI:	
Souhlas zástupce Národního památkového ústavu:	
Souhlas zástupce objednatele:	
Za objednatele převzal	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4755** **Revitalizace NKP Vlašský dvůr**

Objekt: **D2** **DODATEK č. 2 - FINAL**

Rozpočet: **ZL č. 013** **Vytvoření místnosti pro diesel agregát**

Objednatel: **Město Kutná Hora** IČO: **00236195**
Havlíčkovo náměstí 552/1 DIČ: **CZ00236195**
28401 **Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město**

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** IČO: **03902447**
Příkop 838/6 DIČ: **CZ03902447**
60200 **Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		
Snížená DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v Brně dne 13.2.2019



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				11
64	Výplně otvorů	HSV				14
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	HSV				4
99	Staveništní přesun hmot	HSV				0
763	Konstrukce suché výstavby	PSV				70
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D2	DODATEK č. 2 - FINAL
R:	ZL č. 013	Vytvoření místnosti pro diesel agregát

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
1	342012121R00	Příčka SDK tl.75 mm,ocel.kce,1x oplášt., RB 12,5mm zakrytí oken : 4*0,7*1,2	m2	3,36000		
2	342091081R00	Příplatek k příčce sádrokart. za plochu do 2 m2 4*0,7*1,2	m2	3,36000		
Díl: 64 Výplně otvorů						
3	642942212R00	Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 100 mm	kus	2,00000		
4	5533302138R	Zárubeň ocelová SHtm 100/1970/900 L, P, EI, EW 30 pro sádrokartonové příčky, s těsněním, se šroubovanými závěsy	kus	2,00000		
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání						
5	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	15,00000		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
6	998018003U00	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace	t	0,13889		
Díl: 763 Konstrukce suché výstavby						
7	763001001RV1	Úpravy pro dodatečně doplňovanou sádrokartonovou příčku	kpl	1,00000		
8	763111314	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75 TI tl. 60 mm, EI	m2	19,46000		
9	998763404	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	%	157,16520		

Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře

Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339
Veřejná zakázka	VZ 04 Generální zhotovitel stavby – budova Vlašského dvora v rámci projektu „Revitalizace NKP Vlašský dvůr“
Odběratel:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01, Kutná Hora
Dodavatel:	Unistav Construction a.s.
Změnový list:	č.014
Předmět změny:	Záměna podlahy v kancelářích ekon. úsek a Plavec etapa VII a XII
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	Změna "de minimis" podle § 222, odst. (4) ZZVZ, neměnicí celkovou povahu zakázky.
Zdůvodnění změny:	
Zjištění:	Při demontáži stávajících podlahových krytin v kancelářích ekon. úsek a Plavec etapa VII a XII bylo zjištěno, že plánovaná repase a opětovná pokládka parket není fyzicky možná vzhledem ke stavu demontovaných parket a jakákoliv další oprava je neekonomická. Podloží je nevyhovující a muselo by dojít ke kompletní rekonstrukci celé skladby.
Návrh řešení:	Z výše uvedených důvodů bylo rozhodnuto, že v ekonomickém úseku a v kancelářích u pana Plavce bude provedena podlaha z laminátové plovoucí podlahy ve standardu odpovídajícímu komerčním prostorům a jejich namáhání.
Odpočet "méněprací":	
Přípočet "víceprací":	
Dopad na cenu (saldo):	
Přílohy:	Příloha 1 Rozpočet
Souhlas zhotovitele:	
Souhlas TDI:	
Souhlas zástupce Národního památkového ústavu:	
Souhlas zástupce objednatele:	
Za objednatele převzal	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: U4755 Revitalizace NKP Vlašský dvůr
Objekt: D2 DODATEK č. 2 - FINAL
Rozpočet: ZL č. 014 Záměna podlahy v kancelářích ekon. úsek a Plavec na plovoucí

Objednatel: Město Kutná Hora IČO: 00236195
 Havlíčkovo náměstí 552/1 DIČ: CZ00236195
 28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447
 Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447
 60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

Snížená DPH

15 %

Základ pro základní DPH

21 %

Základní DPH

21 %

Zaokrouhlení


Cena celkem s DPH

v

Brno

dne

13.2.2019



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
775	Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)	PSV				100
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D2	DODATEK č. 2 - FINAL
R:	ZL č. 014	Záměna podlahy v kancelářích ekon. úsek a Plavec na plovoucí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 775		Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)				
1	775	D+M laminátové podlahy bez soklů - 233,0 m2	kpl	1,00000		
2	776	Úprava podkladu místnosti č. 238 - 233,0 m2	kpl	1,00000		
3	762525109	Oprava podlah hoblovaných na pero a drážku z palubek 30 % včetně materiálu	m2	-179,60000		
4	762511264	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku 18 mm nebroušených, tloušťky desky	m2	-233,00000		
5	611553500	Podlahoviny dřevěné příslušenství k plovoucím podlahám podložky 25 / 50 / 100 / 175 m2 role PE pěnová 2 mm	m2	-233,00000		
6	775511649	Podlahy vlysové masivní repasované lepené rybinový, řemenový, průpletový vzor s tmelením a broušením , bez povrchové úpravy a olištování z vlysů tl. do 22 mm šířky přes 60 do 70 mm, délky přes 400 do	m2	-233,00000		
7	775591191	Ostatní prvky pro plovoucí podlahy montáž podložky vyrovnávací a tlumící	m2	-233,00000		
8	775591319	Skládané podlahy - ostatní práce celkové s mezibroušením základní lak, mezibroušení laku, vrchní lak , mezibroušení laku, vrchní lak	m2	-233,00000		
9	998775204	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	%	-548,67700		

Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře

Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339
Veřejná zakázka	VZ 04 Generální zhotovitel stavby – budova Vlašského dvora v rámci projektu „Revitalizace NKP Vlašský dvůr“
Odběratel:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01, Kutná Hora
Dodavatel:	Unistav Construction a.s.
Změnový list:	č.015
Předmět změny:	Doplnění ocel. nosných kcí do skladby podlahy náklad. plošiny m.č. 208 a,b
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	Změna podle § 222, odst. (6) ZZVZ, vzniklá v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky.
Zdůvodnění změny:	
Zjištění:	Doplnění ocel. nosných kcí do skladby podlahy náklad. plošiny m.č. 208 a,b – při rozkrytí stropní konstrukce v místě provádění výtahové plošiny bylo zjištěno, že je nutné doplnění ocelové výměny (v místě stávajícího trámového stropu) pro zajištění únosnosti stropu.
Návrh řešení:	Z výše uvedených důvodů bylo rozhodnuto, že bude stávající stropní konstrukce zesílena pomocí ocelové výměny dle nově zpracovaného statického návrhu.
Odpočet "méněpráci":	
Připočet "vícepráci":	
Dopad na cenu (saldo):	
Přílohy:	Příloha 1 Rozpočet
Souhlas zhotovitele:	
Souhlas TDI:	
Souhlas zástupce Národního památkového ústavu:	
Souhlas zástupce objednatele:	
Za objednatele převzal	

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
Objekt:	D2	DODATEK č. 2 - FINAL
Rozpočet:	ZL č. 015	Doplnění ocel. nosných kcí do skladby podlahy náklad. výtahu
Objednatel:	Město Kutná Hora Havlíčkovo náměstí 552/1 28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město	IČO: 00236195 DIČ: CZ00236195
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6 60200 Brno	IČO: 03902447 DIČ: CZ03902447

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		
Snížená DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		
Zaokrouhlení			
Cena celkem s DPH			

v Brno dne 13.2.2019



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV				98
99	Staveništní přesun hmot	HSV				2
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D2	DODATEK č. 2 - FINAL
R:	ZL č. 015	Doplnění ocel. nosných kcí do skladby podlahy náklad. výtahu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
Díl: 4		Vodorovné konstrukce					
1	413232221R00	Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm	kus	4,00000			
2	413941125R00	Osazování ocelových válcových nosníků ve střepech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 a výše nebo výšky přes 220 mm obtížný přístup i montáž	t	0,57088			
"IPE 270" : (6,35+6,05)*36,1/1000				0,44764			
"IPE 160" : (1,95*4)*15,8/1000				0,12324			
3	130107580	Svařenec v jakosti 11 375 ocel profilová I IPE h=270 mm	kg	492,40400			
4	130107480	ocel profilová v jakosti 11 375 ocel profilová I IPE h=160 mm	kg	135,56400			
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					
5	998018003U00	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace	t	0,88279			

Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře

Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339
Veřejná zakázka	VZ 04 Generální zhotovitel stavby – budova Vlašského dvora v rámci projektu „Revitalizace NKP Vlašský dvůr“
Odběratel:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01, Kutná Hora
Dodavatel:	Unistav Construction a.s.
Změnový list:	č.016
Předmět změny:	Dozdivky pod vyřezané vaznice na půdě
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	Dodatečné stavební práce podle § 222, odst. (5) ZZVZ, které nebyly zahrnuty v původním závazku, ale jsou nezbytné pro dokončení zakázky. Změna v osobě zadavatele není možná a způsobila by zadavateli obtíže a výrazně zvýšila náklady.
Zdůvodnění změny:	
Zjištění:	Dozdivky pod vyřezané vaznice na půdě – projektová dokumentace nepočítala s provedením dozdivek v místě rušených vaznic, z konstrukčního hlediska bylo nutné je doplnit.
Návrh řešení:	V místě rušených vaznic byla provedena dodatečná dozdivka, která zajistí statické podepření v místě přerušené vaznice.
Odpočet "méněpraci":	
Připočet "vícepraci":	
Dopad na cenu (saldo):	
Přílohy:	Příloha 1 Rozpočet
Souhlas zhotovitele:	
Souhlas TDI:	
Souhlas zástupce Národního památkového ústavu:	
Souhlas zástupce objednatele:	
Za objednatele převzal	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: U4755 Revitalizace NKP Vlašský dvůr
Objekt: D2 DODATEK č. 2 - FINAL
Rozpočet: ZL č. 016 Dozdivky pod vyřezané vaznice na půdě

Objednatel: Město Kutná Hora IČO: 00236195
 Havlíčkovo náměstí 552/1 DIČ: CZ00236195
 28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447
 Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447
 60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		
Snížená DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		
Zaokrouhlení			
Cena celkem s DPH			

v Brně

dne 13.2.2019



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				40
31	Zdi podpěrné a volné	HSV				37
94	Lešení a stavební výtahy	HSV				7
99	Staveništní přesun hmot	HSV				16
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D2	DODATEK č. 2 - FINAL
R:	ZL č. 016	Dozdívky pod vyřezané vaznice na půdě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
1	346275115R00	Přizdívky z desek Ytong tl. 150 mm 0,4*5,0	m2	2,00000		
					2,00000	
2	311001001RV1	Vyřezávání tvárnic pro osazení do krovu	hod	10,00000		
Díl: 31 Zdi podpěrné a volné						
3	310238211R00	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou	m3	0,41490		
		0,45*0,3*0,3			0,04050	
		0,65*0,48*1,2			0,37440	
4	310239211R00	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vápenocementovou	m3	0,47250		
		0,9*2,1*0,25			0,47250	
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						
5	941955102R00	Lešení lehké pomocné, schodiště, H podlahy do 3,5 m	m2	5,00000		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
6	998018003U00	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace	t	1,98201		

Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře

Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339
Veřejná zakázka	VZ 04 Generální zhotovitel stavby – budova Vlašského dvora v rámci projektu „Revitalizace NKP Vlašský dvůr“
Odběratel:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01, Kutná Hora
Dodavatel:	Unistav Construction a.s.
Změnový list:	č.017
Předmět změny:	Úprava dveří do plynoměrné místnosti v prostoru půdy
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	Dodatečné stavební práce podle § 222, odst. (5) ZZVZ, které nebyly zahrnuty v původním závazku, ale jsou nezbytné pro dokončení zakázky. Změna v osobě zadavatele není možná a způsobila by zadavateli obtíže a výrazně zvýšila náklady.
Zdůvodnění změny:	
Zjištění:	Úprava dveří do plynoměrné místnosti v prostoru půdy – stávající plynoměrná místnost je v jiné výškové úrovni než nově provedená podlaha archivu.
Návrh řešení:	Z výše uvedeného důvodu musela být provedena úprava stávajícího vstupního otvoru a to včetně osazení nových dveří.
Odpočet "méněpráci":	
Připočet "vícepráci":	
Dopad na cenu (saldo):	
Přílohy:	Příloha 1 Rozpočet
Souhlas zhotovitele:	
Souhlas TDI:	
Souhlas zástupce Národního památkového ústavu:	
Souhlas zástupce objednatele:	
Za objednatele převzal	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: U4755 Revitalizace NKP Vlašský dvůr
Objekt: D2 DODATEK č. 2 - FINAL
Rozpočet: ZL č. 017 Úprava dveří do plynoměrné místnosti na půdě

Objednatel: Město Kutná Hora IČO: 00236195
 Havlíčkovo náměstí 552/1 DIČ: CZ00236195
 28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447
 Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447
 60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		
Snížená DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		
Zaokrouhlení			
Cena celkem s DPH			

v Brně

dne 13.2.2019



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				11
4	Vodorovné konstrukce	HSV				5
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV				10
64	Výplně otvorů	HSV				36
96	Bourání konstrukcí	HSV				8
99	Staveništní přesun hmot	HSV				4
997	Přesun sutě	HSV				25
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D2	DODATEK č. 2 - FINAL
R:	ZL č. 017	Úprava dveří do plynoměrné místnosti na půdě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
1	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 1,3*14,3*2*0,001	t	0,03718		
				0,03718		
2	317234410	Vyzdivka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou 1,3*0,25*0,14	m3	0,04550		
				0,04550		
3	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm 1,3*0,14*2	m2	0,36400		
				0,36400		
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						
4	434311114R00	Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 16/20	m	0,90000		
5	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení 0,2*0,9	m2	0,18000		
				0,18000		
6	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	0,18000		
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						
7	612325302U00	Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková 2,0*0,3*2,0+1,0*0,3	m2	1,50000		
				1,50000		
Díl: 64 Výplně otvorů						
8	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	1,00000		
9	5533302137889R	Zárubeň ocelová EI 30 s těsněním	kus	1,00000		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
10	964072221R00	Vybourání nosníků ze zdi smíšené dl. 4 m, 20 kg/m 1,3*14,3*2*0,001	t	0,03718		
				0,03718		
11	971033541R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC zvětšení otvoru pro dveře : 1,3*0,3*0,6	m3	0,23400		
				0,23400		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
12	998018003U00	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace	t	0,35563		
Díl: 997 Přesun sutě						
13	997013118	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 24 do 27 m	t	1,28197		
14	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých	t	10,25576		
15	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,28197		
16	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	15,38364		
17	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	1,28197		
18	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	1,28197		

Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře

Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339
Veřejná zakázka	VZ 04 Generální zhotovitel stavby – budova Vlašského dvora v rámci projektu „Revitalizace NKP Vlašský dvůr“
Odběratel:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01, Kutná Hora
Dodavatel:	Unistav Construction a.s.
Změnový list:	č.018
Předmět změny:	Doplnění tesařských kcí na půdě
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	Dodatečné stavební práce podle § 222, odst. (5) ZZVZ, které nebyly zahrnuty v původním závazku, ale jsou nezbytné pro dokončení zakázky. Změna v osobě zadavatele není možná a způsobila by zadavateli obtíže a výrazně zvýšila náklady.
Zdůvodnění změny:	
Zjištění:	Doplnění tesařských kcí na půdě – při provádění komunikační trasy (nová ocelová lávka) v půdním prostoru docházelo ke kolizi se stávajícím krovem.
Návrh řešení:	V kolizních místech byla nutná tesařská úprava (zkrácení přesahů trámů, provedení dodatečných výměn apod.
Odpočet "méněprací":	
Přípočet "víceprací":	
Dopad na cenu (saldo):	
Přílohy:	Příloha 1 Rozpočet
Souhlas zhotovitele:	
Souhlas TDI:	
Souhlas zástupce Národního památkového ústavu:	
Souhlas zástupce objednatele:	
Za objednatele převzal	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4755** **Revitalizace NKP Vlašský dvůr**

Objekt: **D2** **DODATEK č. 2 - FINAL**

Rozpočet: **ZL č. 018** **Doplnění tesařských kcí na půdě**

Objednatel: **Město Kutná Hora** IČO: **00236195**
Havlíčkovo náměstí 552/1 DIČ: **CZ00236195**
28401 **Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město**

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** IČO: **03902447**
Příkop 838/6 DIČ: **CZ03902447**
60200 **Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		
Snížená DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		
Zaokrouhlení			
Cena celkem s DPH			

v Brně

dne 13.2.2019



Rekapitulace dílů


Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
762	Konstrukce tesařské	PSV				100
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D2	DODATEK č. 2 - FINAL
R:	ZL č. 018	Doplnění tesařských kcí na půdě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
1	762	Doplnění tesařských konstrukcí	kpl	1,00000		
2	76204	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci),	kpl	1,00000		
doplnění : 1				1,00000		
3	998762204R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	%	201,33000		

Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře

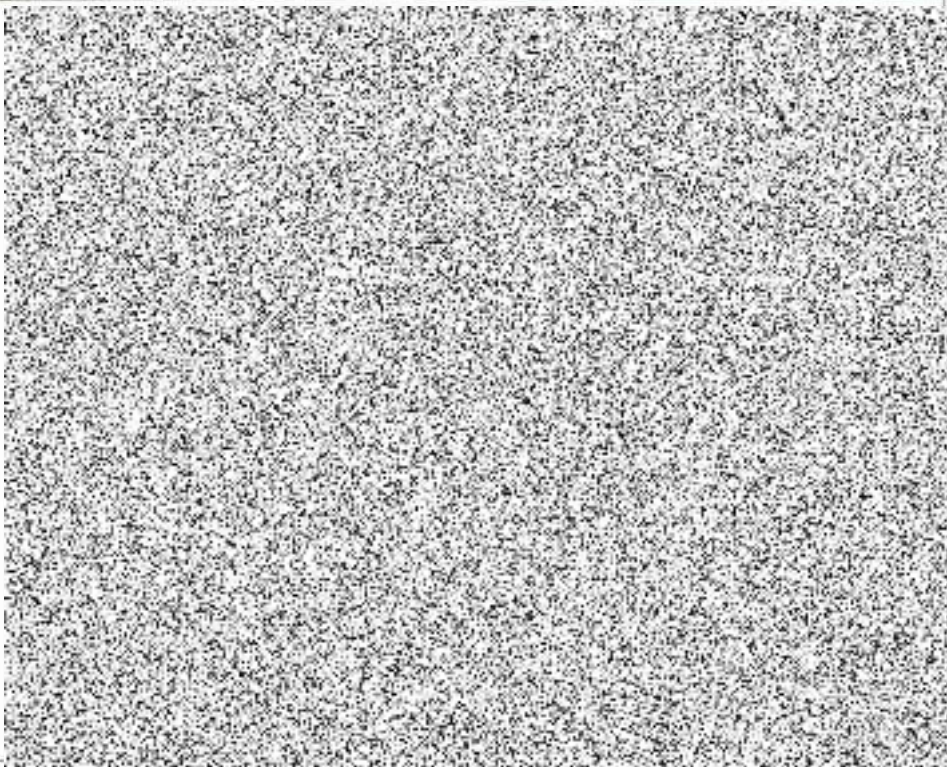Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339
Veřejná zakázka	VZ 04 Generální zhotovitel stavby – budova Vlašského dvora v rámci projektu „Revitalizace NKP Vlašský dvůr“
Odběratel:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01, Kutná Hora
Dodavatel:	Unistav Construction a.s.
Změnový list:	č.019
Předmět změny:	Odstranění nefunkčního odvětrávacího potrubí
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	Dodatečné stavební práce podle § 222, odst. (5) ZZVZ, které nebyly zahrnuty v původním závazku, ale jsou nezbytné pro dokončení zakázky. Změna v osobě zadavatele není možná a způsobila by zadavateli obtíže a výrazně zvýšila náklady.
Zdůvodnění změny:	
Zjištění:	Odstranění nefunkčního odvětrávacího potrubí skrze půdní prostor do prostoru nad střechu – V prostoru nově budovaných archivů bylo zjištěno, že kameninové větrací potrubí v místě archivu je již nefunkční.
Návrh řešení:	Z výše uvedených důvodů bylo rozhodnuto o demontáži těchto potrubí a tím zamezení prostorové kolize s regálovým systémem archivu.
Odpočet "méněprací":	
Přípočet "víceprací":	
Dopad na cenu (saldo):	
Přílohy:	Příloha 1 Rozpočet
Souhlas zhotovitele:	
Souhlas TDI:	
Souhlas zástupce Národního památkového ústavu:	
Souhlas zástupce objednatele:	
Za objednatele převzal	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: U4755 Revitalizace NKP Vlašský dvůr
Objekt: D2 DODATEK č. 2 - FINAL
Rozpočet: ZL č. 019 Odstranění nefunkč. větracího potrubí na půdě

Objednatel: Město Kutná Hora IČO: 00236195
 Havlíčkovo náměstí 552/1 DIČ: CZ00236195
 28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447
 Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447
 60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		
Snížená DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		
Zaokrouhlení			
Cena celkem s DPH			

v

Brno

dne

13.2.2019



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				70
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	HSV				6
99	Staveništní přesun hmot	HSV				0
721	Vnitřní kanalizace	PSV				16
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU				8
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D2	DODATEK č. 2 - FINAL
R:	ZL č. 019	Odstranění nefunkč. větracího potrubí na půdě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
1	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod	28,00000		
		ztižená práce v půdním prostoru : 28		28,00000		
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání						
2	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	10,00000		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
3	998018003U00	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace	t	0,00210		
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						
4	721110806R00	Demontáž potrubí z kameninových trub DN 200	m	21,00000		
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
5	997013118	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 24 do 27 m	t	0,56070		
6	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých	t	3,36420		
7	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,56070		
8	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	6,72840		
9	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	0,56070		
10	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	0,56070		

Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře

Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339
Veřejná zakázka	VZ 04 Generální zhotovitel stavby – budova Vlašského dvora v rámci projektu „Revitalizace NKP Vlašský dvůr“
Odběratel:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01, Kutná Hora
Dodavatel:	Unistav Construction a.s.
Změnový list:	č.20
Předmět změny:	Bourání afaltu v m.č. 238 (ekonomové-trezor), zazdění otvoru dveří mezi m.č. 237 a 236
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	Změna "de minimis" podle § 222, odst. (4) ZZVZ, nemění celkovou povahu zakázky.
Zdůvodnění změny:	
Zjištění:	Bourání afaltu v m.č. 238 (ekonomové-trezor), zazdění otvoru dveří mezi m.č. 237 a 236 – po odkrytí pochozí vrstvy v místnosti č 238 bylo zjištěno, že podloží bylo tvořeno asfaltovou vyrovnávací vrstvou o mocnosti několik centimetrů ze které se uvolňovali nebezpečné výpary s velmi nepříjemným zápachem. Dále byla na základě požadavku ekonomického oddělení provedena zazdívka dveřního otvoru mezi m.č. 237 a 236
Návrh řešení:	Bylo rozhodnuto o okamžité likvidaci asfaltové vrstvy. (jedná se o nestandardní podlahovou konstrukci-běžně byla parketa pouze lepena na tenkou vrstvu asfaltové zálivky).
Odpočet "méněpraci":	
Přípočet "vícepraci":	
Dopad na cenu (saldo):	
Přílohy:	Příloha 1 Rozpočet
Souhlas zhotovitele:	
Souhlas TDI:	
Souhlas zástupce Národního památkového ústavu:	
Souhlas zástupce objednatele:	
Za objednatele převzal	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: U4755 Revitalizace NKP Vlašský dvůr
Objekt: D2 DODATEK č. 2 - FINAL
Rozpočet: ZL č. 020 Bourání afaltu v m.č. 238, zazdění otvoru dveří

Objednatel: Město Kutná Hora IČO: 00236195
 Havlíčkovo náměstí 552/1 DIČ: CZ00236195
 28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447
 Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447
 60200 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 %

Snížená DPH 15 %

Základ pro základní DPH 21 %

Základní DPH 21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v

Brno

dne

13.2.2019



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				14
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV				7
96	Bourání konstrukcí	HSV				77
99	Staveništní přesun hmot	HSV				2
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D2	DODATEK č. 2 - FINAL
R:	ZL č. 020	Bourání afaltu v m.č. 238, zazdění otvoru dveří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	310271620R00	Zazdívka otvorů do 4 m2, pórobet.tvárnice, tl.20cm 1,6*2,6*0,15	m3	0,62400		
				0,62400		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
2	612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit 1,6*2,6*2	m2	8,32000		
				8,32000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
3	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 1,6*2,6	m2	4,16000		
				4,16000		
4	960001001RV1	Bourání asfaltu m.č. 238	hod	12,00000		
5	960001002RV2	Ruční přesun suti	hod	24,00000		
6	960001003RV1	Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu	kpl	1,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
7	998018003U00	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24	t	0,50021		

Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře

Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339
Veřejná zakázka	VZ 04 Generální zhotovitel stavby – budova Vlašského dvora v rámci projektu „Revitalizace NKP Vlašský dvůr“
Odběratel:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01, Kutná Hora
Dodavatel:	Unistav Construction a.s.
Změnový list:	č.21
Předmět změny:	Vyrovnaní a zpevnění rabicové příčky mezi m.č. 236 a 237 (ekonomové)
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	Změna podle § 222, odst. (6) ZZVZ, vzniklá v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky.
Zdůvodnění změny:	
Zjištění:	Vyrovnaní a zpevnění rabicové příčky mezi m.č. 236 a 237 (ekonomové) – po provedení montážních otvorů pro elektroinstalace byla odhalena nevyhovující konstrukce stávající rabicové příčky mezi uvedenými místnostmi.
Návrh řešení:	Na základě výše uvedeného zjištění bylo rozhodnuto o jejím celkovém zpevnění perlínkou do tmelu a přetažení povrchu lepidlem. (ostatní příčky v objektu jsou zděné nebo ze SDK-tato konstrukce nebyla předpokládána).
Odpočet "méněprací":	
Přípočet "víceprací":	
Dopad na cenu (saldo):	
Přílohy:	Příloha 1 Rozpočet
Souhlas zhotovitele:	
Souhlas TDI:	
Souhlas zástupce Národního památkového ústavu:	
Souhlas zástupce objednatele:	
Za objednatele převzal	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4755** **Revitalizace NKP Vlašský dvůr**

Objekt: **D2** **DODATEK č. 2 - FINAL**

Rozpočet: **ZL č. 021** **Vyrovnání příčky mezi m.č. 236 a 237**

Objednatel: **Město Kutná Hora**

IČO: **00236195**

Havlíčkovo náměstí 552/1

DIČ: **CZ00236195**

28401

Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.**

IČO: **03902447**

Příkop 838/6

DIČ: **CZ03902447**

60200

Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

Snížená DPH

15 %

Základ pro základní DPH

21 %

Základní DPH

21 %

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

v

Bře

dne

13.2.2019



Rekapitulace dílů


Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV				98
99	Staveništní přesun hmot	HSV				2
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D2	DODATEK č. 2 - FINAL
R:	ZL č. 021	Vyrovnání příčky mezi m.č. 236 a 237

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
1	612481211RT8	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Cemix 6,55*4*2	m2	52,40000		
				52,40000		
2	612481271R00	Přetažení stěny lepidlem bez perlínky	m2	52,40000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
3	998018003U00	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24	t	0,37780		

Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře

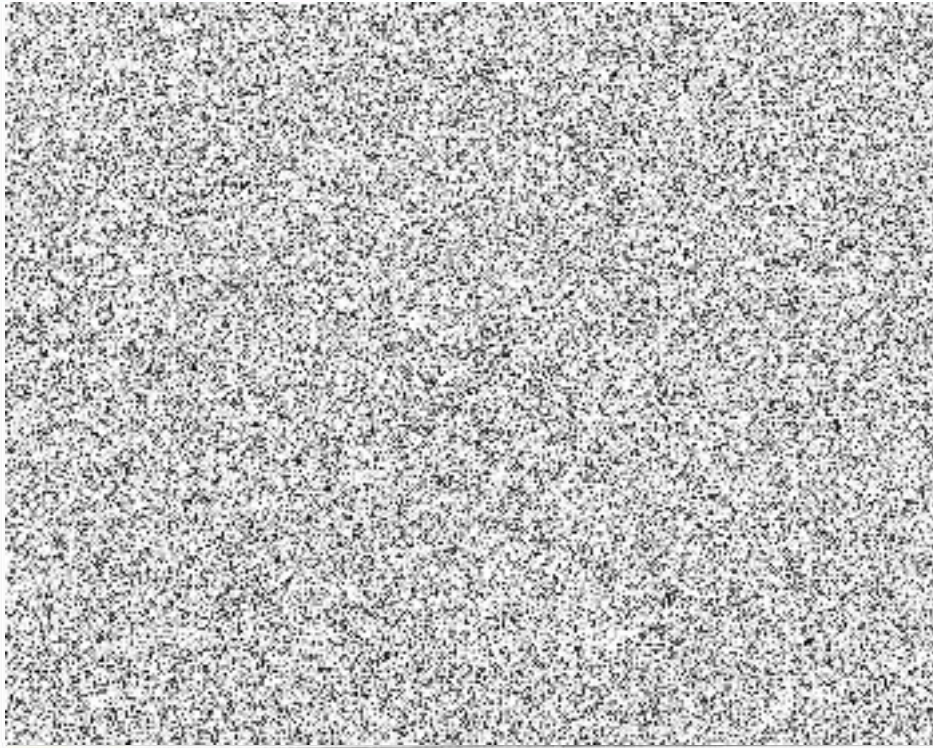Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339
Veřejná zakázka	VZ 04 Generální zhotovitel stavby – budova Vlašského dvora v rámci projektu „Revitalizace NKP Vlašský dvůr“
Odběratel:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01, Kutná Hora
Dodavatel:	Unistav Construction a.s.
Změnový list:	č.22
Předmět změny:	Opravy rákosových stropů v m.č. 233, 234, 235 a 236 (ekonomové)
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	Dodatečné stavební práce podle § 222, odst. (5) ZZVZ, které nebyly zahrnuty v původním závazku, ale jsou nezbytné pro dokončení zakázky. Změna v osobě zadavatele není možná a způsobila by zadavateli obtíže a výrazně zvýšila náklady.
Zdůvodnění změny:	
Zjištění:	Opravy rákosových stropů v m.č. 233, 234, 235 a 236 (ekonomové) – při provádění prací bylo zjištěno, že stávající omítka stropů v uvedených místnostech není soudržná.
Návrh řešení:	Na základě výše uvedeného zjištění došlo k lokálnímu odstranění nesoudržných vrstev, upevnění rákosů a následně kompletní celoplošné opravě stropů.
Odpočet "méněprací":	
Přípočet "víceprací":	
Dopad na cenu (saldo):	
Přílohy:	Příloha 1 Rozpočet
Souhlas zhotovitele:	
Souhlas TDI:	
Souhlas zástupce Národního památkového ústavu:	
Souhlas zástupce objednatele:	
Za objednatele převzal	

Položkový rozpočet stavby



Stavba:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
Objekt:	D2	DODATEK č. 2 - FINAL
Rozpočet:	ZL č. 022	Opravy rákosových stropů v m.č. 233, 234, 235 a 236
Objednatel:	Město Kutná Hora Havlíčkovo náměstí 552/1 28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město	IČO: 00236195 DIČ: CZ00236195
Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6 60200 Brno	IČO: 03902447 DIČ: CZ03902447

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		
Snížená DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		
Zaokrouhlení			
Cena celkem s DPH			

v Brně dne 13.2.2019



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV				99
99	Staveništní přesun hmot	HSV				1
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D2	DODATEK č. 2 - FINAL
R:	ZL č. 022	Opravy rákosových stropů v m.č. 233, 234, 235 a 236

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
1	611481211RT8	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Cemix 25,1+19,1+27,8+27,1	m2	99,10000		
2	612481271R00	Přetažení stěny lepidlem bez perlinky	m2	99,10000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
3	998018003U00	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24	t	0,75911		

Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře

Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339
Veřejná zakázka	VZ 04 Generální zhotovitel stavby – budova Vlašského dvora v rámci projektu „Revitalizace NKP Vlašský dvůr“
Odběratel:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01, Kutná Hora
Dodavatel:	Unistav Construction a.s.
Změnový list:	č.23
Předmět změny:	nahrazení sklápěcích schodů žebříkem - 3NP archiv
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	Změna "de minimis" podle § 222, odst. (4) ZZVZ, neměnicí celkovou povahu zakázky.
Zdůvodnění změny:	
Zjištění:	původně navržené řešení pomocí sklápěcích schodů bylo nahrazeno dodáním hliníkového žebříku. Toto řešení má výhodu v možné variabilitě uspořádání regálů (nehrozí kolize s výletem na strop archivu).
Návrh řešení:	navržené řešení pomocí sklápěcích schodů bylo nahrazeno dodáním hliníkového žebříku.
Odpočet "méněprací":	
Přípočet "víceprací":	
Dopad na cenu (saldo):	
Přílohy:	Příloha 1 Rozpočet
Souhlas zhotovitele:	
Souhlas TDI:	
Souhlas zástupce Národního památkového ústavu:	
Souhlas zástupce objednatele:	
Za objednatele převzal	

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
Objekt:	D2	DODATEK č. 2 - FINAL
Rozpočet:	ZL č. 023	Změny leden_Sklápěcí schody

Objednatel:	Město Kutná Hora Havlíčkovo náměstí 552/1 28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město	IČO: 00236195 DIČ: CZ00236195
-------------	---	----------------------------------

Zhotovitel:	UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6 60200 Brno	IČO: 03902447 DIČ: CZ03902447
-------------	---	----------------------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem	
HSV		
PSV		
MON		
Vedlejší náklady		
Ostatní náklady		
Celkem		
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH		15 %
Snížená DPH		15 %
Základ pro základní DPH		21 %
Základní DPH	21 %	
Zaokrouhlení		
Cena celkem s DPH		

v Brně

dne 13.2.2019



Rekapitulace dílů


Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV				100
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D2	DODATEK č. 2 - FINAL
R:	ZL č. 023	Změny leden_Sklápěcí schody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
1	766231113	Montáž sklápěcích schodů na půdu s vyřezáním otvoru a kompletizací	kus	-1,00000		
2	6123316	schody hliníkové skládací 110 x 70 cm, pro výšku 220 - 280 cm, 12 schodnic, poklop s tep. izolac PO 30	kus	-1,00000		
3	766002002RV1	Dodávka žebříku 3x7 schůdků hliníkových	ks	1,00000		
4	998766204R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 36 m	%	-20,00000		

Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře

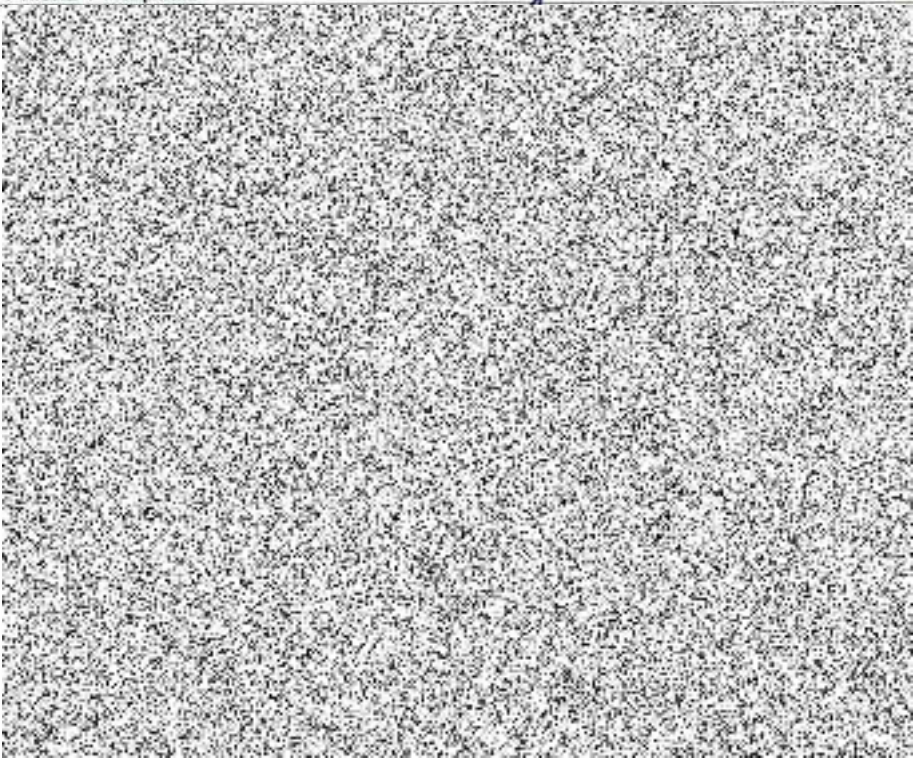Registrační číslo projektu:	CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000339
Veřejná zakázka	VZ 04 Generální zhotovitel stavby – budova Vlašského dvora v rámci projektu „Revitalizace NKP Vlašský dvůr“
Odběratel:	Město Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552, 284 01, Kutná Hora
Dodavatel:	Unistav Construction a.s.
Změnový list:	č.24
Předmět změny:	neprovedené práce – foukaná izolace
Odůvodnění zadání zhotoviteli:	Změna podle § 222, odst. (6) ZZVZ, vzniklá v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Zdůvodnění změny:	
Zjištění:	Neprováděné práce – jedná se o odpočet, který souvisí s neprovedením foukané izolace a dalších souvisejících konstrukcí – demontáž a zpětná montáž záklopu včetně pokládky cihelné dlažby.
Návrh řešení:	Foukaná izolace nemohla být provedena v místě chodeb 2NP, protože zde bylo po provedení sond zjištěno, že chodbový strop tvoří pouze jednoduchý vrchní záklop a není zde tedy vzduchová mezera vhodná k zafoukání minerálních vláken.
Odpočet "méněpraci":	
Přípočet "vícepraci":	
Dopad na cenu (saldo):	
Přílohy:	Příloha 1 Rozpočet
Souhlas zhotovitele:	
Souhlas TDI:	
Souhlas zástupce Národního památkového ústavu:	
Souhlas zástupce objednatele:	
Za objednatele převzal	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U4755** **Revitalizace NKP Vlašský dvůr**

Objekt: **D2** **DODATEK č. 2 - FINAL**

Rozpočet: **ZL č. 024** **Neprováděné práce**

Objednatel: **Město Kutná Hora** IČO: **00236195**
Havlíčkovo náměstí 552/1 DIČ: **CZ00236195**
28401 **Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město**

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.** IČO: **03902447**
Příkop 838/6 DIČ: **CZ03902447**
60200 **Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		
Snížená DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		
Zaokrouhlení			
Cena celkem s DPH			

v Brno

dne 13.2.2019



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
713	Izolace tepelné	PSV				100
Cena celkem						100

Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	D2	DODATEK č. 2 - FINAL
R:	ZL č. 024	Neprováděné práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713		Izolace tepelné				
1	596311020	Dlaždice cihelné pálené dlažba ruční cihelná 20 x 20 x 3 cm	kus	-836,87750		
2	631511000	Vlna minerální volná a výrobky z ní (desky z minerální vlny a kombinované) vata minerální fukaná IZOSpol fukaná minerální vata IZOSpol	m3	-90,48900		
3	713112215R	Montáž tepelné fukané vodorovné izolace konstrukcí z minerálních vláken, tloušťky vrstvy přes 180 do 200 mm	m2	-350,74000		
4	713112217	Montáž tepelné fukané vodorovné izolace konstrukcí z minerálních vláken, tloušťky vrstvy přes 220 do 250 mm	m2	-168,25000		
5	762811932	Záklop stropů vyřezání částí záklopu nebo podbíjení z prken nebo fošen tl. přes 32 mm, otvoru plochy jednotlivě přes 0,25 do 1,00 m2	m	-295,36000		
6	762812942	Záklop stropů zabednění částí záklopu z prken nebo fošen tl. přes 32 mm (materiál v ceně), otvoru plochy jednotlivě přes 0,25 do 1,00 m2	m2	-39,46000		
7	771531007	Montáž podlahy z dlaždic cihelných nebo portlandských tloušťky do 30 mm kladených do malty přes 22 do 25 ks/m2	m2	-39,50400		
8	771531801	Demontáž podlah z dlaždic cihelných nebo portlandských kladených do malty	m2	-39,50400		
9	965082923	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	-3,94200		
