




SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a násl. občanského zákoníku
(dále také jen „smlouva“)







ev. č. objednatele:

ev. zak. č. PORR CZ350.25.0372.1

I. SMLUVNÍ STRANY

- 1. Objednatel:** **Město Kutná Hora**
Sídlo: Havlíčkovo náměstí 552/1,
KUTNÁ HORA-VNITŘNÍ MĚSTO
284 01 KUTNÁ HORA 1
IČ: 00236195
DIČ: CZ00236195 Obec
Zastoupený: 
Bankovní spojení: 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizačních: 

dále také jen „objednatel“

- 2. Zhotovitel:** **PORR a.s.**
Sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560 (plátce DPH)
Zastoupený:  vedoucím provozu východ na úseku
Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Čechy (na základě plné moci) a
 ekonomem provozu Východ na úseku
Dopravních staveb PORR a.s., Oblast Čechy (na základě plné moci)
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd. B, vložka 1006
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizačních:
 stavbyvedoucí, tel.: 
e-mail: 
Bankovní spojení: 

dále také jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na uzavření smlouvy o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí díla a objednatel se zavazuje převzít dílo a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení.

II. PŘEDMĚT DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných v této smlouvě k provedení díla

„Oprava komunikace v ulici Libenická v Kutné Hoře:

2. Místo plnění/realizace: k.ú. Kaňk.
3. Bližší vymezení díla:
Dílo bude provedeno v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 02.06.2025 (Příloha č. 1 této smlouvy).

4. Podkladem pro provedení díla jsou:
 - Cenová nabídka zhotovitele ze dne 02.06.2025
 - Pokyny a požadavky investora v rozsahu nabídky zhotovitele
5. Součástí díla **není**:
 - zpracování dokumentace skutečného provedeného stavu
 - stavební povolení
 - zábory pozemků a veřejných ploch
 - realizační projektovou dokumentaci (RDS)
 - bankovní záruka za provedení díla
 - pojištění stavby
 - přístupové komunikace.
 - pracoviště správce stavby
 - publicita a propagace projektu (billboard, pamětní deska)
 - záchranný archeologický dohled
 - pasportizace a repasportizace stavbou dotčených objektů
 - dopravní inženýrské opatření.
6. Za vadu díla ve smyslu § 2615 občanského zákoníku se nepovažují drobné odchylky díla od výsledku určeného v této smlouvě, které byly dohodnuty souhlasným zápisem oprávněných osob uvedených v čl. I. této smlouvy ve stavebním deníku. Drobnou odchylkou se rozumí odchylka, která nemění řešení přijaté v projektové dokumentaci a nemá vliv na dobu provedení díla.
7. Za účelem dosažení optimálních ekonomických výsledků zavazují se obě strany operativně spolupracovat s přihlédnutím k zásadám podnikatelské etiky, poskytovat si pomoc a vyměňovat si vzájemně informace v oblasti upravené touto smlouvou.
8. V ceně je uvažováno provedení prací na 1 etapu (v plně uzávěře), což znamená na 1 nájezd techniky. V případě dalších nájezdů se cena navyšuje o 30.000,- Kč plus DPH za každý další nájezd navíc.

III. CENA

1. Za provedení díla vymezeného v čl. II. smlouvy se při respektování ostatních ustanovení této smlouvy sjednává cena dle cenové nabídky zhotovitele (příloha č. 1) ve výši:

Cena díla bez DPH 1 080 838,38- Kč (1.307.814,44 Kč s DPH)

Cena díla je sjednána jako konečná a nejvýše přípustná. Změna ceny díla je možná v souladu se zněním této smlouvy a jen písemnou formou prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků smlouvy.

Jednotkové ceny uvedené v „Cenové nabídce zhotovitele (příloha č. 1 této smlouvy) jsou pevné a platné pouze po dobu provádění díla, max však do konce 12/2025. Nedojde-li po tomto datu k dohodě smluvních stran o ceně prací, a pokud se strany nedohodnou na případném navýšení ceny ani v přiměřené době, nejpozději do 10 dnů od písemného oznámení zhotovitele, je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy s účinky k okamžiku doručení oznámení o odstoupení. V případě, že zhotovitel využije možnosti odstoupení od smlouvy, není objednatel oprávněn uplatnit nárok na jakoukoliv újmu způsobenou tímto odstoupením.

Konečná cena díla bude součtem násobků skutečně provedených výkonů odsouhlasených odpovědným zástupcem objednatele (dle zaměření) a jednotkových cen uvedených v příloze č. 1, s tím, že tato částka nepřekročí výše uvedenou konečnou a nejvýše přípustnou cenu díla, s tím, že k takto získané částce bude účtována daň z přidané hodnoty v souladu s ustanovením z. č. 235/2004 Sb., Sb. zákona o dani z přidané hodnoty. V souladu s ust. § 2625 Občanského zákoníku vyúčtuje zhotovitel na žádost objednatele dosavadní postup prací,

jakož i dosud vynaložené náklady. **Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy nebude použito v souvislosti s jeho ekonomickou činností.**

Objednatel čestně prohlašuje, že přijaté plnění tj. plnění poskytnuté zhotovitelem dle této smlouvy nesouvisí výhradně s činností příjemce při výkonu veřejné správy.

Podkladem pro sjednání ceny je příloha č. 1 této smlouvy, kalkulace cenové nabídky zhotovitele.

2. Cena bez DPH uvedená v bodě 1. **zahrnuje veškeré náklady zhotovitele potřebné k řádnému provedení díla** v rozsahu a podmínkách cenové nabídky zhotovitele (Příloha č. 1 smlouvy), v nabízeném termínu a kvalitě. Cena je sjednána jako celková cena v cenové úrovni k datu předání díla (po celou dobu provádění prací).

Cena uvedená výše v bodě 1 může být překročena jen v následujícím případě:

- a) v průběhu realizace díla dojde ke změně předpisů o dani z přidané hodnoty s dopadem na nabídkovou cenu
- b) v případě většího množství prací než uvedeného v Příloze č. 1 této smlouvy
- c) v případě požadavku objednatele na provedení dalších a nových prací, v Příloze č. 1 smlouvy neobsažených (výhrada úplnosti - objeví-li se při provádění díla potřeba činností do rozpočtu nezahrnutých, pokud nebyly předvídatelné v době uzavření smlouvy, může zhotovitel požadovat zvýšení ceny s tím, že nutnost překročení a výši požadovaného zvýšení ceny musí zhotovitel sdělit bez zbytečného odkladu poté, kdy se při provádění díla ukázala jeho nevyhnutelnost).

Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit k objednateli k odsouhlasení.

Vícepráce budou oceněny takto:

na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkovou cenu ve výši jednotkové ceny podle Přílohy č. 1 této smlouvy a pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy v Příloze č. 1 této smlouvy, tak zhotovitel zpracuje individuální kalkulaci podléhající odsouhlasení objednatelem.

Nastane-li však zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která dokončení díla podstatně ztěžuje, může soud podle svého uvážení rozhodnout o spravedlivém zvýšení ceny za dílo, anebo o zrušení smlouvy a o tom, jak se strany vypořádají.

3. V jednotkové ceně jsou již obsaženy veškeré pomocné práce a vedlejší náklady zhotovitele.
4. Zmaří-li objednatel provedení díla z důvodu, za nějž odpovídá, náleží zhotoviteli cena za dílo snížená o to, co zhotovitel neprovedením díla ušetřil.
5. Dohodnou-li se strany po uzavření smlouvy na omezení nebo rozšíření rozsahu díla a neujednají-li výjimečně důsledky pro výši ceny, zaplatí objednatel cenu upravenou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným prováděním díla.

IV. ČAS PLNĚNÍ

1. Zhotovitel provede dílo vymezené v čl. II. smlouvy v následujícím čase:

zahájení	06/2025
dokončení	10/2025

V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet výše uvedený předpokládaný termín zahájení, posunuje o počet dnů prodlení se zahájením rovněž termín pro dokončení prací zhotovitele, přičemž doba plnění zůstává nezměněna.

Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.

Čas plnění je ujednáno ve prospěch zhotovitele.

2. Zhotovitel je povinen posunout zahájení nebo přerušit provádění díla, pokud nebudou splněny meteorologické podmínky potřebné pro řádné provedení díla (doba a důvody posunu zahájení nebo přerušování provádění díla budou zhotovitelem s odkazem na příslušné ČSN zapsány a objednatelem potvrzeny zápisem ve stavebním deníku).
3. Lhůta pro provedení díla uvedená v bodě 1. se prodlužuje o dobu, po kterou bylo posunuto zahájení nebo přerušeno provádění díla dle bodu 2.
4. V případě, že z důvodů na straně zhotovitele nebude možné dodržet výše uvedený předpokládaný termín dokončení díla, o takové dny prodlení se prodlužuje platnost jednotkových cen ve smyslu čl. III odst. 1 této smlouvy. Prodloužení platnosti jednotkových cen dle předchozí věty platí i v případě dle čl. IX odst. 11 této smlouvy.

V. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE NUTNÉ KE SPLNĚNÍ ZÁVAZKU ZHOTOVITELE

1. Staveniště:

- 1.1. Staveništěm se rozumí prostor určený ke zhotovení díla.
- 1.2. Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště v celém rozsahu a bez právních a faktických závad nejpozději ke dni zahájení prací uvedenému v čl. IV. bod 1. O odevzdání staveniště bude sepsán zápis, který podepíší obě strany.
- 1.3. Objednatel zabezpečí zhotoviteli bezplatné užívání prostoru staveniště po celou dobu provádění díla a po dobu potřebnou k vyklizení staveniště.
- 1.4. Zařízení staveniště zhotovitele bude umístěno na ploše o výměře cca 100 m². V prostoru zařízení staveniště budou zhotovitelem umístěny buňky, stavební materiál a stavební mechanizmy.

2. Doklady potřebné k provedení díla:

- 2.1. Objednatel obstará na své náklady veškeré doklady potřebné dle platných právních předpisů k provedení smlouveného díla vyjma projektové dokumentace a k užívání prostoru staveniště prováděním stavebních prací, u kterých platné právní předpisy nebo příslušné orgány požadují, aby je objednatel opatřil svým jménem (zejména stavební povolení, ohlášení).
- 2.2. Doklady uvedené v odst. 2.1. předá objednatel zhotoviteli nejpozději při jednání o odevzdání staveniště.

3. Další spolupůsobení objednatele:

- 3.1. Objednatel zajistí možnost zpevněného příjezdu nákladních automobilů a mechanismů zhotovitele do prostoru staveniště.
- 3.2. Objednatel zajistí vytyčení všech podzemních inženýrských sítí, které mohou být dotčeny činností zhotovitele a zhotoviteli předá vyjádření všech správců inženýrských sítí dotčených výstavbou a opravou komunikací.
- 3.3. Neobsazeno.
- 3.4. Objednatel se postará o to, aby práce zhotovitele nebyly omezovány právy třetích osob.
- 3.5. Zhotovitel doloží míru zhutnění podkladních vrstev a splnění ČSN protokolem.
- 3.6. Veškerá spolupůsobení objednatele uvedená v bodě 3. (3.1.; 3.2. a 3.4.) poskytne objednatel na své náklady.
- 3.7. Je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, určí mu zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Uplyne-li lhůta marně, má zhotovitel právo podle své volby si buď zajistit náhradní plnění na účet objednatele, anebo, upozornil-li na to objednatel, odstoupit od smlouvy.
- 3.8. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. To

neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče.

Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění díla, zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li objednatel na provádění díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě. Lhůta stanovená pro dokončení díla se prodlužuje o dobu prokazatelně přerušením vyvolanou. Zhotovitel má právo na úhradu nákladů prokazatelně spojených s přerušením díla nebo s použitím nevhodných věcí do doby, kdy jejich nevhodnost mohla být zjištěna. Zachová-li se zhotovitel podle prvních dvou odstavců, nemá objednatel práva z vady díla vzniklé pro nevhodnost věci nebo příkazu.

Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění, může zhotovitel od smlouvy odstoupit.

- 3.9. Má-li objednatel opatřit věc k provedení díla, předá ji zhotoviteli v dohodnuté době, jinak bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy. Má se za to, že se cena díla o cenu této věci nesnižuje.

Neopatří-li objednatel věc včas a neučiní-li tak ani na výzvu zhotovitele v dodatečně přiměřené době, může věc opatřit zhotovitel na účet objednatele. Cenu věci a náklady účelně vynaložené s jejím opatřením objednatel zhotoviteli zaplatí bez zbytečného odkladu poté, co jej o placení zhotovitel požádá.

VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. K jednání o předání a převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně (doporučeným dopisem nebo zápisem ve stavebním deníku proti podpisu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech předání a převzetí díla) nejméně 3 pracovní dny předem. Jednání o předání a převzetí díla bude zahájeno dnem, který zhotovitel uvede v tomto oznámení.
2. Při jednání o předání a převzetí díla předloží zhotovitel objednateli příslušné doklady prokazující řádné provedení díla (atesty materiálů, výsledky zkoušek apod.).
3. Při jednání o předání a převzetí díla provede objednatel prohlídku předmětu díla za účelem zjištění případných vad a nedodělků.
4. Objednatel je povinen převzít dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělkami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
Objednatel je povinen dokončené dílo převzít a to s výhradami nebo bez výhrad. Převezme-li objednatel dílo bez výhrad, nepřizná mu soud právo ze zjevné vady díla, namítne-li zhotovitel, že právo nebylo uplatněno včas.
5. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis, který podepíší obě smluvní strany. V zápise musí objednatel uvést všechny případné vady a nedodělkami zjevné při předání a převzetí díla – neučiní-li tak, zanikají jeho práva z odpovědnosti zhotovitele za tyto vady a nedodělkami. Požádá-li objednatel při jednání o předání a převzetí díla o odstranění zjevných vad či nedodělků, dohodnou smluvní strany v zápise o předání a převzetí díla lhůty pro jejich odstranění.
Provádí-li se dílo postupně a lze-li jednotlivé stupně odlišit, může být předáno a převzato i po částech.
6. Má-li být dokončení díla prokázáno provedením ujednaných zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené úspěšným provedením zkoušek. K účasti na nich zhotovitel objednatele včas přizve; nezúčastní-li se objednatel zkoušky a nevylučuje-li to povaha věci, nebrání to jejich provedení.
Výsledek zkoušky se zachytí v zápise; není-li objednatel přítomen, potvrdí zápis místo něho hodnověrná, odborně způsobilá a nestranná osoba, jež se zkoušek zúčastnila. Nepřičí-li se to

- povaze závazku, je zhotovitel povinen objednateli na jeho žádost zápis předat.
7. Nedostaví-li se objednatel k jednání o předání a převzetí díla, ke kterému byl řádně vyzván, nebo nebude-li objednatel řádně pokračovat v zahájeném jednání o předání a převzetí díla anebo odmítne-li objednatel neoprávněně dílo převzít, má se zato, že zhotovitel ke dni, uvedenému ve výzvě k jednání o předání a převzetí díla, dílo řádně dokončil a předal objednateli a to se všemi důsledky, se kterými právní předpisy nebo tato smlouva předání a převzetí řádně dokončeného díla spojují.
 8. Ujednání uvedená výše v bodech 1. - 7. se vztahují přiměřeně i na jednání o předání a převzetí zhotovitelem odstraněných vad a nedodělků, na jejichž odstranění se smluvní strany dohodly v zápise o předání a převzetí díla, a dále i na jednání o předání a převzetí zhotovitelem odstraněných vad, které objednatel reklamoval v rámci záruky za jakost díla.

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování díla.
2. Na předběžnou úhradu nákladů spojených s provedením díla neposkytne objednatel zhotoviteli zálohu.
3. Veškeré platby budou realizovány v českých korunách.
4. Podkladem pro zaplacení díla bude následující daňový doklad:
 - měsíční faktura vystavená vždy k 15. dni příslušného měsíce a konečná faktura, kterou zhotovitel vystaví po předání a převzetí díla a která bude obsahovat celkovou platební bilanci díla. Přílohou konečné faktury bude zápis o předání a převzetí díla potvrzený objednatel a zhotovitelem.
5. Vystavení konečné faktury bude předcházet zjišťování objemu skutečně provedených prací, které se bude řídit následujícími pravidly:
 - a) úhrada ceny díla bude prováděna vždy po uplynutí běžného kalendářního měsíce na základě daňových dokladů – faktur a konečné faktury, jejichž přílohami bude vždy soupis provedených prací odsouhlasený oprávněným zástupcem objednatele. Přílohou faktury bude položkový rozpočet - soupis provedených prací. – faktur a konečné faktury, jejichž přílohami bude vždy soupis provedených prací odsouhlasený oprávněným zástupcem objednatele,
 - b) objednatel doklady dle písm. a) do 5 pracovních dnů od jejich obdržení potvrdí nebo vrátí zhotoviteli s písemnými připomínkami - neučiní-li tak, má se zato, že s předloženými doklady souhlasí a zhotovitel je oprávněn vystavit příslušný daňový doklad.
6. Daňové doklady uhradí objednatel zhotoviteli bezhotovostní platbou ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného na příslušném daňovém dokladu – konečné faktuře.
7. Splatnost měsíční i konečné faktury je 30 dnů od jejího doručení objednateli. Za okamžik uhrazení daňového dokladu se považuje okamžik, kdy byla předmětná částka připsána na účet bankovního ústavu zhotovitele.
8. Daňové doklady musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Pokud objednatel obdrží od zhotovitele fakturu, která nebude obsahovat některou náležitost nebo bude mít jinou závadu v obsahu, je oprávněn vrátit ji do 5 pracovních dnů od obdržení bez zaplacení zhotoviteli s písemným uvedením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti vrácenou fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne vystavení opravené nebo nově vyhotovené faktury.
9. Převezme-li objednatel dílo s vadami či nedodělkami a smluvní strany dohodnou v zápise o předání a převzetí díla lhůty pro jejich odstranění, je objednatel oprávněn zadržet k zajištění závazku zhotovitele odstranit tyto vady a nedodělků až 10 % z celkové ceny za provedení díla

bez DPH uvedené v konečné faktuře s tím, že zadržanou část ceny je povinen uvolnit do 10 kalendářních dnů poté, co zhotovitel odstraní veškeré vady a nedodělky, na jejichž odstranění se smluvní strany dohodly v zápise o předání a převzetí díla.

10. Za prodlení s úhradou konečné faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý den prodlení.
11. Zhotovitel neposkytne objednateli bankovní záruku za provedení díla a ani se nebude podílet na poměrných nákladech souvisejících s jejím zajištěním. Totéž platí i pro pojištění díla.

VIII. ZÁRUKA ZA JAKOST

1. Zhotovitel poskytuje za předpokladu řádného provozování a údržby předmětu díla záruku za jakost díla. Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel závazek, že předmět díla bude během záruční doby způsobilý pro použití k obvyklému účelu. V průběhu záruční doby a na jejím konci může dílo vykazovat běžné známky opotřebení.
2. Záruční doba na dílo - stavbu počíná běžet ode dne dokončení a předání díla bez vad a nedodělků objednateli a její délka činí **36 měsíců**.
Je-li součástí díla dodávka komponentů a zařízení, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu jinou než je smluvní záruka poskytovaná zhotovitelem nebo se jedná o dodávky a práce, které mají v návodu na použití předepsanou nebo se běžně uvažuje s běžnou údržbou či jejich obnovou ve lhůtě kratší než poskytnutá smluvní záruka, platí pro takový komponent, zařízení, dodávky nebo práce záruční doby odlišné od smluvní záruky, pokud je zhotovitel při předání díla dokladuje objednateli příslušnými originály záručních listů výrobce, návodem k použití nebo dohodnutým a objednatelem potvrzeným soupisem, min. však 24 měsíců.
Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat předmět díla pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
3. Práva objednatele ze záruky zanikají, jestliže objednatel nepodá zhotoviteli zprávu o vadách předmětu díla bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo mohl zjistit při vynaložení odborné péče.
4. Pokud objednatel bude ve včas zasláném oznámení vady požadovat odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka za jakost, je zhotovitel povinen vadu v přiměřené lhůtě odstranit (přiměřenost lhůty pro odstranění vady se posoudí podle povahy vady, rozsahu vady, meteorologických podmínek potřebných pro řádné odstranění dané vady atd.).
5. Záruka za jakost se nevztahuje na vady, které mají původ ve zhotovitelem nezaviněných skutečnostech (porucha stávajících tj. zhotovitelem v rámci díla neprovedených vrstev komunikace), ani na vady, které mají původ v nadměrném dopravním zatížení - nadměrným dopravním zatížením se rozumí dopravní zatížení větší než stávající v době uzavření této smlouvy a jeho obvyklý nárůst. Záruka za jakost se rovněž nevztahuje na vady, které byly způsobeny po převzetí díla objednatelem, třetími osobami nebo vnějšími událostmi nebo podkladními vrstvami.
Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel, ani při vynaložení veškeré odborné péče, kterou lze rozumně požadovat, nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.
6. Objednatel není oprávněn požadovat provedení náhradního díla, jestliže předmět díla vzhledem k jeho povaze nelze vrátit nebo předat zhotoviteli.
Strany si dále ujednaly, že pokud bude plnění podle této smlouvy vadné a vada bude odstranitelná, nemůže objednatel požadovat slevu z ceny, pokud je vada odstranitelná a zhotovitel je připraven takovou vadu odstranit, bez zbytečného odkladu začne vyvíjet činnost

směřující k odstranění vady, v takové činnosti řádně pokračuje a v rozumném čase a řádně vadu odstraní či předmět plnění vymění za bezvadný.

7. Zhotovitel se zproští povinnosti z vady stavby, prokáže-li, že vadu způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil, nebo jen selhání dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednatel (investor) zvolil.

IX. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Stanoví-li smlouva, že objednatel zkontroluje předmět díla na určitém stupni jeho provádění (s výjimkou zakrývaných prací dle posledního odstavce tohoto bodu 1), zhotovitel pozve objednatele ke kontrole. Nepozve-li jej včas nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, umožní objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.
Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván nebo jež se měla konat podle ujednaného časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Objednatel má právo na provedení dodatečné kontroly, nahradí však zhotoviteli náklady s tím spojené, zabránila-li mu v účasti na kontrole vyšší moc a požádal-li o dodatečnou kontrolu bez zbytečného odkladu, jinak jde k jeho tíži vše, co dodatečná kontrola vyvolá.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty. Objednatel je povinen nejpozději do 2 dnů po obdržení výzvy zakrývané práce zkontrolovat. O kontrole prací zakrytých v průběhu provádění díla budou sepsány zápisy, které podepíší obě smluvní strany. Nedostaví-li se objednatel, ač řádně vyzván, ke kontrole zakrývaných prací, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění díla, tj. je oprávněn předmětné práce zakrýt.
2. Zhotovitel má povinnost vést stavební deník a to v rozsahu daném příslušným právním předpisem (vyhláška č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb). Originál při ukončení odevzdá zadavateli. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k záznamům v něm uvedeným připojovat denně svá stanoviska. Jestliže některá smluvní strana nesouhlasí s obsahem záznamu druhé smluvní strany, zapíše to do 2 dnů do deníku s uvedením důvodu, jinak se má zato, že s obsahem záznamu souhlasí.
3. Dohodnou-li smluvní strany po uzavření smlouvy v souladu s čl. II. bodem 6. této smlouvy zápisem ve stavebním deníku drobné odchylky díla od výsledku určeného v této smlouvě, jsou povinny sjednat současně rovněž zápisem ve stavebním deníku jejich důsledky na výši ceny - do dosažení dohody o cenových důsledcích těchto odchylek postupuje zhotovitel dle uzavřené smlouvy. Dohoda o změně ceny z titulu drobných odchylek díla od výsledku určeného v této smlouvě, uzavřená souhlasným zápisem smluvních stran ve stavebním deníku, bude závazným podkladem pro uzavření dodatku k této smlouvě a pro fakturaci a placení.
4. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za každý den prodlení za pozdní provedení/odevzdání předmětu plnění bez vad a nedodělků ve lhůtě dle čl. IV. této smlouvy smluvní pokutu **ve výši 3.000,- Kč** za každý započatý den prodlení, po nejpozdějším datu ukončení díla. Ustanovení o smluvní pokutě dle tohoto bodu 5 neplatí v případě, že nedodržení těchto termínů podmiňujících smluvní pokutu bylo způsobeno objednatelem nebo v důsledku vyšší moci nebo v případě, že prodlení s dokončením dílčích termínů díla bylo vyrovnáno a byl zhotovitelem dodržen konečný termín dokončení. Použití smluvních pokut bude posunuto o časový úsek rovnající se způsobenému prodlení. Pro tento případ smluvní strany vylučují aplikaci § 2050 Občanského zákoníku.
Objednatel je povinen zaplatiti zhotoviteli smluvní pokutu za pozdní platbu faktury a to 0,02 % z dlužné částky bez DPH a to za každý den prodlení s úhradou.
5. Převezme-li objednatel dílo s vadami nebo nedodělků a smluvní strany dohodnou v zápise o předání a převzetí díla lhůty pro jejich odstranění, je zhotovitel povinen

za prodlení se splněním povinnosti odstranit vady nebo nedodělky v dohodnutých lhůtách zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý případ (vadu nebo nedodělek) a den prodlení. Pro tento případ smluvní strany vylučují aplikaci § 2050 Občanského zákoníku.

6. V případě nedodržení termínu nástupu na odstranění vady v záruční době brání užívání předmětu díla v dohodnuté lhůtě je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý případ (soubor vad uvedený v 1 oznámení) a den prodlení. Pro tento případ smluvní strany vylučují aplikaci § 2050 Občanského zákoníku.
7. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdech k němu pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi.
8. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 3 pracovních dnů od předání díla objednateli. Po uplynutí této lhůty je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi jen stroje, výrobní zařízení a materiál, potřebné k odstranění vad a nedodělků, se kterými objednatel dílo převzal a na jejichž odstranění se smluvní strany dohodly v zápise o předání a převzetí díla - tyto věci je zhotovitel povinen vyklidit do zahájení jednání o předání a převzetí zhotovitelem odstraněných vad a nedodělků, na jejichž odstranění se smluvní strany dohodly v zápise o předání a převzetí díla.
9. Za podstatné porušení smluvních povinností objednatele ve smyslu § 2002 odst. 1 občanského zákoníku se považuje zejména nesplnění povinností uvedených v čl. V. této smlouvy a prodlení s plněním peněžitých závazků dle čl. VII. této smlouvy - nesplní-li objednatel řádně a včas některý z těchto závazků, je zhotovitel oprávněn dle své volby:
10. Odstoupí-li zhotovitel od smlouvy pro prodlení objednatele a nespočívá-li překážka pro splnění povinnosti objednatele v okolnostech vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku, náleží zhotoviteli celková cena, na kterou má nárok na základě této smlouvy za provedení díla v plném rozsahu. Od této ceny se však odečte to, co zhotovitel ušetřil neprovedením díla v plném rozsahu. V ostatních případech odstoupení zhotovitele od smlouvy pro prodlení objednatele náleží zhotoviteli cena za část díla, kterou provedl do odstoupení od smlouvy, a úhrada nákladů, které účelně vynaložil v souvislosti s prováděním díla do odstoupení od smlouvy.

Zhotovitel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že ohledně majetku objednatele bylo zahájeno insolvenční řízení (řízení o úpadku), insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka, bylo povoleno moratorium nebo pokud je objednatel v likvidaci. Ustanovení § 253 z. č. 182/2006 Sb. tímto není dotčeno.

Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě nekvalitního provádění prací zhotovitelem a dále rovněž v případě prodlení zhotovitele, jestliže z dosavadního průběhu prací s přihlédnutím ke všem okolnostem je objektivně zřejmé, že zhotovitelem nebude dílo dokončeno včas.

V případě prodlení objednatele s úhradou splatných závazků delším než 15 dnů oproti stanovenému termínu splatnosti je zhotovitel oprávněn přerušit provádění prací a to bez jakýchkoliv sankcí s tím, že o dobu prodlení s úhradou splatných částek objednatele se prodlužuje termín dokončení díla zhotovitelem a dále zhotovitel nebude v prodlení s prováděním prací dle této smlouvy.

V případě prodlení objednatele s úhradou splatných závazků delším než 30 dnů oproti stanovenému termínu splatnosti je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

10.1. odstoupit od smlouvy bez zbytečného odkladu poté, co se o nesplnění povinnosti objednatele dověděl

10.2. nezahájit nebo přerušit provádění díla s tím, že minimálně o dobu, po kterou bylo provádění díla nezahájeno či přerušeno, se prodlužuje lhůta pro dokončení díla a dále s tím, že do dosažení dohody o změně smlouvy není zhotovitel povinen zahájit provádění díla nebo v provádění díla pokračovat. Nedohodnou-li se strany do 3 dnů od zahájení jednání o změně smlouvy na změně smlouvy, je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit.

11. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se zejména místa, kde má být dílo provedeno, nebo jiných okolností týkajících se díla jako takového, neuvedené v projektové dokumentaci ani v zápise o předání a převzetí staveniště, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. O dobu přerušeni prací na díle bude posunut termín dokončení díla. K takovému posunutí termínu dokončení díla postačuje zápis ve stavebním deníku.
Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.
12. Žádná ze smluvních stran není povinna zaplatit sjednanou smluvní pokutu, pokud prokáže, že porušení příslušné povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost dle § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.
Strany se dohodly, že kromě případů upravených v § 2913 odst. 2 občanského zákoníku zproští škůdce povinnosti k náhradě škody také mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli v době, kdy byl škůdce v prodlení s plněním smluvených povinností, avšak pouze od okamžiku vzniku takové překážky.
13. Užívání díla před předáním a převzetím (dále též "předčasné užívání"):
 - 13.1. Dílo, které nebylo předáno a převzato, smí být užíváno pouze na podkladě předchozí písemné dohody objednatele se zhotovitelem, ve které bude popsán předmět předčasného užívání a jeho stav, rozsah a způsob předčasného užívání a dále dohodnuta opatření, která pro předčasné užívání objednatel učiní.
 - 13.2. Při převzetí díla ani v záruční době nesmí objednatel vytýkat jako vadu opotřebení a poškození, která by na díle bez předčasného užívání nevznikla.
 - 13.3. Bude-li dílo užíváno před předáním a převzetím bez předchozí písemné dohody se zhotovitelem, má se zato, že veškeré vady díla jsou důsledkem tohoto neoprávněného užívání, pokud objednatel neprokáže, že se jedná o vady, za které odpovídá zhotovitel.
 - 13.4. Dohodne-li objednatel se zhotovitelem písemně, že bude předmět díla předčasně užíván, je objednatel povinen zajistit soulad předčasného užívání s příslušnými právními předpisy, zejména se stavebním zákonem.
14. Při provádění díla bude zhotovitel respektovat platné právní předpisy, platné normy a dále v rámci daném čl. II. a čl. IV. této smlouvy podmínky a lhůty vyplývající ze stavebního povolení a dalších dokladů vydaných orgány státní správy k provedení díla s tím, že případné rozpory mezi vydanými doklady a touto smlouvou budou předmětem dodatku k této smlouvě, ve kterém budou upravena veškerá rozpory dotčená ustanovení této smlouvy.
15. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění stavebně montážních prací a pojištění odpovědnosti za škody. Jedná se o pojištění obecné odpovědnosti za škodu na životě, zdraví či majetku třetí strany vzniklé v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, které vyplývají z předmětu činnosti pojištěného registrované ve Výpisu u obchodního rejstříku.
16. V případě působení koordinátora BOZP ve smyslu z. č. 309/2006 Sb., v pl. znění na stavbě je objednatel povinen jej seznámit s odpovědným pracovníkem zhotovitele. Strany jsou povinny seznámit se s riziky na pracovištích objednatele, upozornit na ně prokazatelně své pracovníky a určit a zabezpečit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví. Zhotovitel je dále povinen seznámit objednatele s vlastními riziky práce a přijatými opatřeními vztahujícími se k těmto rizikům, o aktuálních rizicích práce na díle objednatele prokazatelně informovat. Strany jsou povinny dodržovat na pracovišti právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví v rozsahu uvedeném v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a předpisech prováděcích a souvisejících, jakož i předpisy zajišťující ochranu životního prostředí, řídit se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, NV 101/2005 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, vyhláškou ČÚBP č. 48/1982 Sb.,

- kteřou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení v platném znění a vyhláškou ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice v platném znění (a v případě prací prováděných hornickou činností vyhláškou č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí v platném znění).
17. Zhotovitel je povinen pořizovat průběžnou fotodokumentaci, dokládající provádění jednotlivých prací při realizaci, kterou na konci realizace odevzdá v originální digitální podobě objednateli.
 18. Zhotovitel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož bude zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu 10 let po skončení plnění zakázky“ a “Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci spojenou s výběrovým řízením do konce roku 2035“.
 19. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a předmětem zakázky a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu díla nezbytné.
 20. Součástí ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady, i ve výkazu výměr výslovně neuvedené, nezbytné pro řádné a úplné provedení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v této smlouvě nejsou uvedeny a zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět.
 21. Zhotovitel poskytne při plnění smlouvy potřebnou součinnost, veškeré změny nebo doplňky této smlouvy musí být provedeny písemnou formou a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran; smluvní strany prohlašují, že si před podpisem tuto smlouvu přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek pro některou z nich.
 22. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu vynaložených prostředků v souvislosti s tímto dílem vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně povinnosti součinnosti poskytnout objednateli (zadavateli) podklady pro zpracování monitorovací zprávy.
 23. V ostatním se vzájemné vztahy smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.


X. VYHOTOVENÍ SMLOUVY, ZMĚNY A ZRUŠENÍ SMLOUVY

1. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
č.1: Cenová nabídka zhotovitele ze dne 02.06.2025 s tím, že v případě rozporu mají ujednání obsažená ve smlouvě přednost před zněním těchto příloh.
2. Smlouvu o dílo lze měnit a doplňovat jen formou vzestupně číslovaných písemných dodatků, označených výslovně jako dodatky ke Smlouvě o dílo a řádně podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To se týká především případů rozšíření předmětu plnění (tzv. vícepráce). Předchozí změna Smlouvy o dílo je nezbytnou podmínkou, bez jejíhož splnění nelze uplatňovat právo na zvýšení ceny. Je vyloučeno měnit tuto smlouvu jinou než písemnou formou.
3. V souladu s ust. § 576 občanského zákoníku jsou jednotlivá ustanovení smlouvy oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení“) a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by

- nahradilo kolizní ustanovení. Stejně bude postupováno i v případě, že by se některé z ustanovení této smlouvy ukázalo zdánlivým (nicotným).
4. Veškeré případné ústní či písemné dohody objednatele a zhotovitele týkající se účasti zhotovitele na realizaci tohoto díla, uzavřením této Smlouvy o dílo pozbývají platnosti s tím, že zanikají i veškeré závazky smluvních stran, které z takových dohod případně již vznikly.
 5. Strany se dohodly, že se tato smlouva a vztahy z ní vyplývající (práva a povinnosti z ní vzniklá, vč. práv a povinností z jejího porušení, ke kterému došlo nebo dojde) řídí ustanoveními zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Práva a povinnosti ze Smlouvy o dílo vyplývající, jakož i následky z ní vzešlé budou přecházet na případné právní nástupce smluvních stran.
 6. Smluvní strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení sporné věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto spory rozhodovány ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu čl. 25 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (přepřacované znění – Brusel I bis), u místně příslušného soudu České republiky dle sídla zhotovitele.
Smluvní strany souhlasí, že přijmou a vykonají rozhodnutí vzešlé z takového řízení.
 7. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení aplikace ust. § 1799 a 1800 občanského zákoníku týkající se adhezních smluv.
 8. Smluvní strany konstatují, že nejsou vzájemně v postavení tzv. slabší strany ve smyslu § 433 občanského zákoníku.
 9. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení aplikace ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku, tzn., že v právním styku mezi smluvními stranami se k obchodním zvyklostem nepřihlíží, tedy jakákoliv práva a povinnosti nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy nebudou dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy.
Vylučuje se právo objednatele dovolat se ke svému prospěchu záznamů údajů o právních jednáních a jiných skutečnostech v elektronickém systému zhotovitele podle § 562 odst. 2 občanského zákoníku. Dále se vylučuje právo objednatele dovolat se ke svému prospěchu obsahu a doby vystavení písemností týkajících se právních skutečností, k nimž dochází při běžném provozu závodu zhotovitele podle § 566 odst. 2 občanského zákoníku.
Strany vylučují aplikaci ustanovení § 557 (pravidlo contra proferentem).
 10. Strany si vzájemně sdělily všechny okolnosti (skutkové i právní), o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo musely vědět, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy. Kromě ujištění, která si strany poskytly v této smlouvě, nebude mít žádná ze stran další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmkoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá strana informace při jednání o této smlouvě s výjimkou těch případů, kdy daná strana úmyslně uvedla druhou stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu této smlouvy.
 11. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
 12. Strany výslovně potvrzují, že základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek této smlouvy.

13. Nebyl-li adresát zastižen na adrese dle odst. 1., písemnost se uloží na poště a adresát se o této skutečnosti vyrozumí. Nevyzvedne-li si adresát zásilku do 10 kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o doručení nedozvěděl.
Případné doručování prostřednictvím datové schránky není tímto ustanovením dotčeno.
V případě pochybností či sporů se má za to, že v souladu s § 573 občanského zákoníku došla zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání.
14. Smluvní strany se ve smyslu § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly na promlčecí době v délce 4 let, počítané ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
15. Smluvní strany považují veškerá cenová ujednání uvedená v této smlouvě za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a zavazují se zajistit odpovídajícím způsobem jejich utajení. Obchodního tajemství se nelze dovolávat ve vztahu k financujícím stranám a orgánům provádějícím kontrolu.
16. Strany se rovněž dohodly, že je vyloučeno, aby objednatel ve smyslu § 1751 odst. 2 a odst. 3 OZ, odkázal jakýmkoliv způsobem na své obchodní podmínky nebo obchodní podmínky vypracované odbornými nebo zájmovými organizacemi, a platí, že zhotovitel není vázán žádnými obchodními podmínkami objednatele ani obchodními podmínkami vypracovanými odbornými nebo zájmovými organizacemi.
17. Tato Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech písemných exemplářích, z nichž každá strana obdrží po dvou písemných vyhotovení nebo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický originál.
18. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Kutná Hora č. 550/25 ze dne 11.6.2025.

Dne:

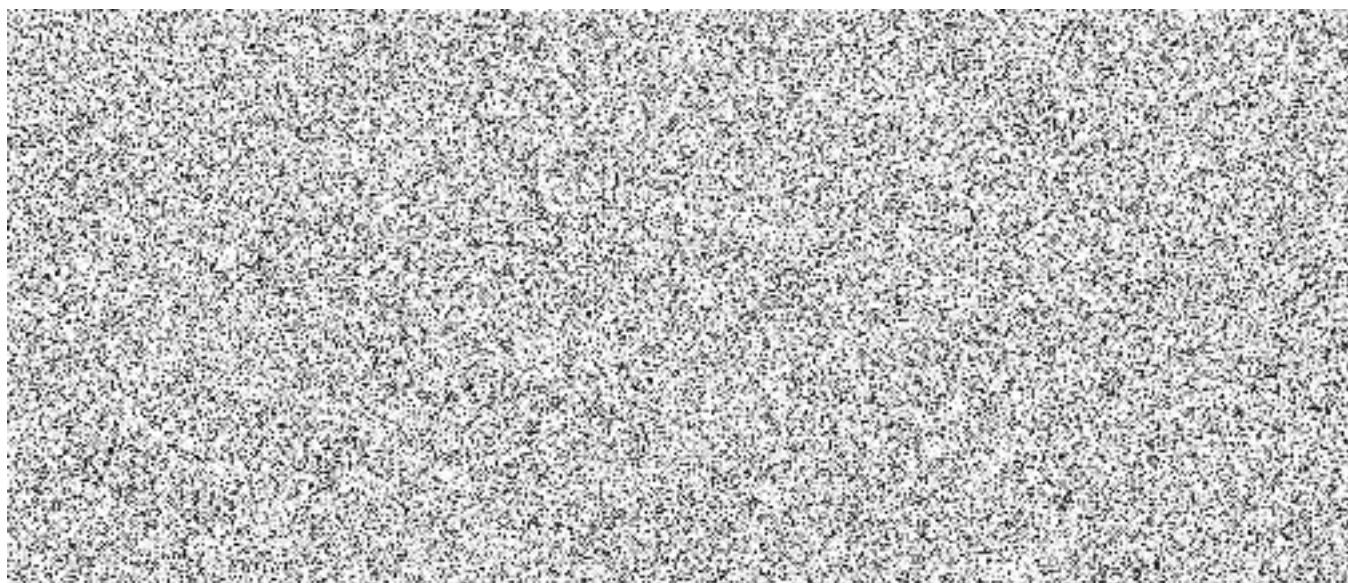

Příloha č. 1

Stavba: Kutná Hora - Opravy povrchu vozovky - ul. Libenická


Objednatel: Městský úřad Kutná Hora

Zhotovitel: PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

Zpracoval: 

rozpočet: ulice Libenická

Datum: 02.06.2025

<u>Popis položky:</u>	<u>MJ</u>	<u>Výměra</u>	<u>JC</u>	<u>Celkem Kč</u>
Odstranění podkladu frézováním tl. 40mm,vč. odvoz skládka	m ²	3082,00		
Poplatek za skládku - vyfrézovaný materiál	t	295,87		
Očištění povrchu zametením, vč. zápichu	m ²	3082,00		
Postřik živičný spojovací do 0.5 kg/ m ²	m ²	3082,00		
Asfaltový beton pro ohrubné vrstvy ACO 11+ tl. 40 mm	m ²	3082,00		
Řezání + těsnění	m	20,00		
Celkem bez DPH				1 080 838,38
DPH 21%				226 976,06
Celkem vč. DPH				1 307 814,44

